



**Информация
о ходе исполнения утвержденной
инвестиционной программы
за 2 квартала 2025 года**

Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 6 месяцев 2025 года



- ✓ Инвестиционная программа Товарищества на 2021-2025 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 20.10.2020 года № 154-ОД.
- ✓ Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ по Карагандинской области от 27.01.2025 года № 16-ОД утверждена инвестиционная программа с учетом изменений в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».
- ✓ Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» от 13.02.2025 года № 19-ОД утверждена инвестиционная программа с учетом изменений.


Наименование мероприятий	Ед. изм.	Утвержденная инвестиционная программа на 2025 год					
		План (год)		Факт (6 месяцев)		% исполне ния	Пояснения
		кол-во	сумма, тыс.тенге, без НДС	кол- во	сумма, тыс.тенге, без НДС		
Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13	м	493	137 820	-	41 257	30%	Договора заключены, строительно-монтажные работы начаты после окончания отопительного сезона и проведения испытаний
Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-29 в городе Караганда (перенос с 2024 года на 2025 год)	работа	1	309 307	1	41 718	13%	
Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-28/1 в г.Караганда	м	585	600 000	-	-	0%	Проект на стадии прохождения гос.экспертизы ПСД
Итого			1 047 127		82 975	8%	

Анализ исполнения инвестиционной программы по итогам 6 месяцев 2025 года (продолжение)

№ п/п	Целевые показатели эффективности, надежности и качества	Принято на отчетный год	Фактически за 6 месяцев отчетного года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13:				<p>Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2025 год находятся на стадии реализации. Показатели эффективности, надежности и качества будут достигнуты после завершения реализации мероприятий.</p>
1.1	Снижение износа реконструируемой сети, %	47%		0%	
1.2	Снижение нормативных потерь, Гкал	25,7		0%	
1.3	Снижение аварийности, ед.дефектов	6		0%	
1.4	Повышение качества теплоснабжения потребителей реконструируемого участка	100%		0%	
2	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-29 в городе Караганда:				
2.1	Повышение качества теплоснабжения потребителей реконструируемого участка	100%		0%	
3	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и насосной станции ЦТП-28/1 в г.Караганда				
3.1	Снижение износа реконструируемой сети, %	43%		0%	
3.2	Снижение нормативных потерь, Гкал	465,4		0%	
3.3	Снижение аварийности, ед.дефектов	6		0%	
3.4	Повышение качества теплоснабжения потребителей реконструируемого участка	100%		0%	

Реконструкция тепловых сетей от узла смешения ул.Архитектурная 13

Место расположения объекта:
г.Караганда, район им.А.Бокейханова

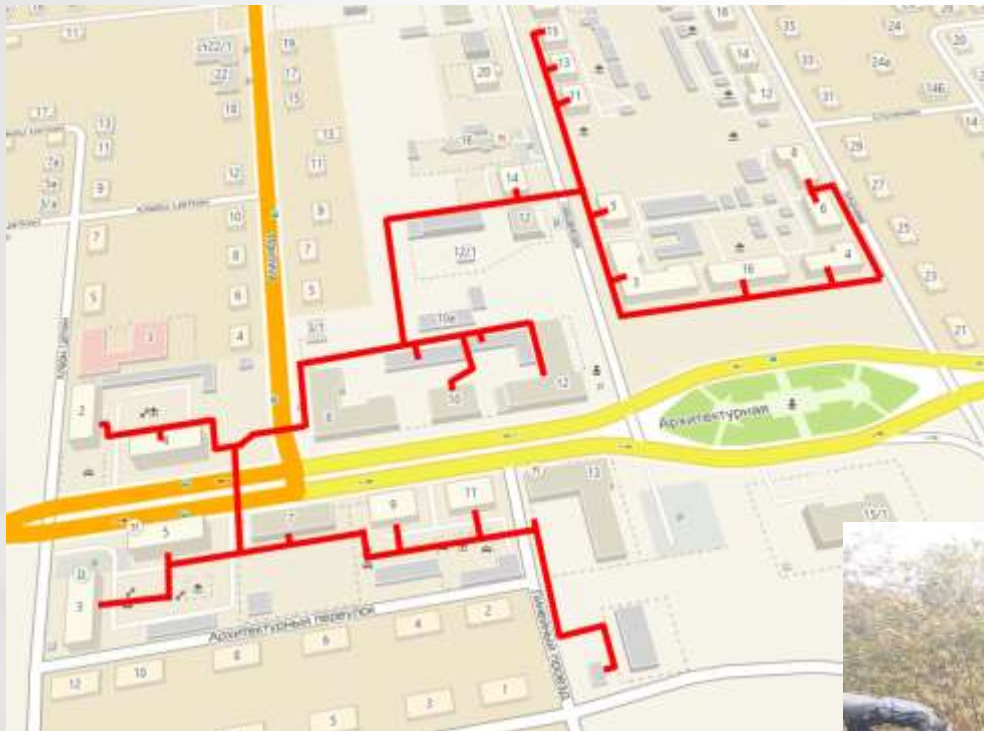


Протяженность общая/2025 г.	км	1,6 / 0,5
Диаметр	мм	57-273
Стоимость общая/2025 г.	млн.тг	548 / 138
Период реализации	2023-2025 гг.	
Подрядчик	ТОО «Астанаинжкомстрой»	

Реконструкция проводится путем замены изношенных участков трубопроводов посредством применения предизолированной трубы в бесканальной прокладке



Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей и насосной станции ЦТП-29

Место расположения объекта:
г.Караганда, район им.Казыбек би

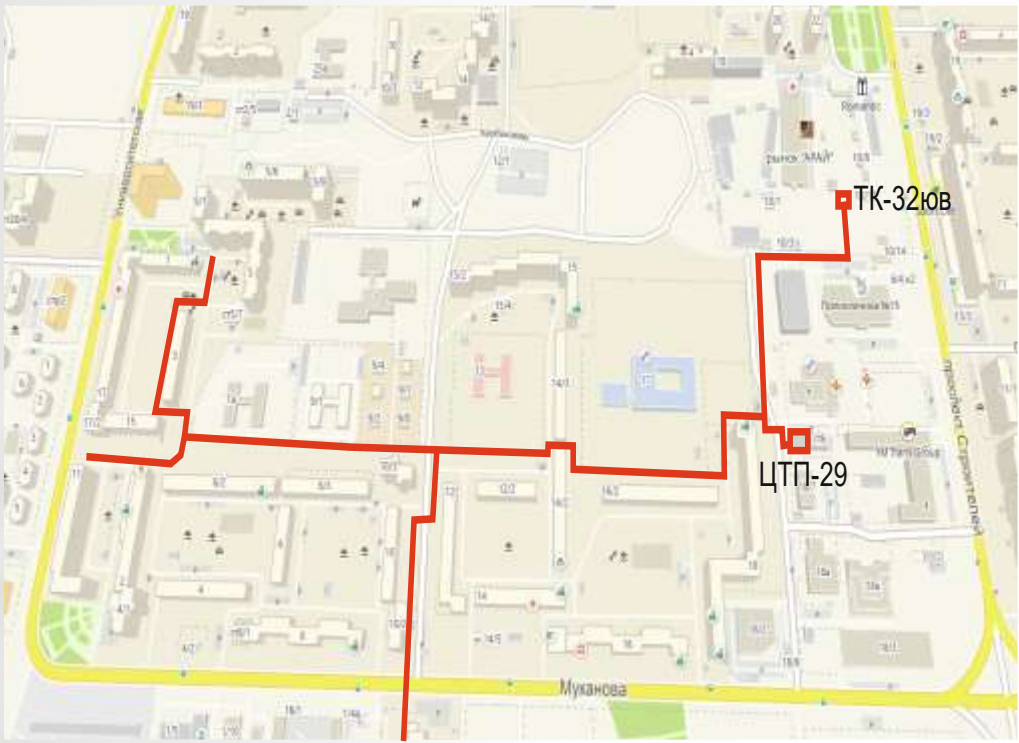

Протяженность общая/2025 г.	км	1,65 / -
Диаметр	мм	150-500
Стоимость общая/2025 г.	млн.тг	1 938 / 309
Период реализации	2024 - 2025 гг.	
Подрядчик	ТОО Астанаинжкомстрой	

Реконструкция проводится путем замены изношенных участков трубопроводов посредством применения предизолированной трубы в бесканальной прокладке

